Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Código: GES-FO-016 Versión: 3 Fecha de Aprobación: 14-Feb-2023 Clasificación: Pública

FECHA	5/01/2026	**PERIODO No.**	24	DEL	**29/12/2025**	AL	**4/01/2026**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE: ESPACIO PUBLICO, PARQUES, PUENTES VEHICULARES Y/O PEATONALES SOBRE CUERPOS DE AGUA Y DE MALLA VIAL EN LA LOCALIDAD DE BOSA. PARQUES Y ESPACIO PUBLICO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	LOCALIDAD DE BOSA – BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
CONTRATO No.:	*FDT-ATBOSA-I-028-2025*			CONTRATO No.:	703-2024 CTO-OBRA (119960) - SECOP II		
PLAZO INICIAL:	DIEZ (10)			PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	17/07/2025			FECHA DE INICIACIÓN:	1/08/2025		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A.			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N.A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/05/2026			FECHA DE TERMINACIÓN:	1/04/2026		
PLAZO ACTUALIZADO:	10	MESES		PLAZO ACTUALIZADO:	8	MESES	
PLAZO TRANSCURRIDO:	172	EQUIVALE AL	**57,33%**	PLAZO TRANSCURRIDO:	157	EQUIVALE AL	**65,42%**
VALOR INICIAL :	$	650.082.636,00		VALOR INICIAL :	$	4.462.324.289,00	
VALOR ADICION(ES):	N.A.			VALOR ADICION(ES):	N.A.		
VALOR ACTUALIZADO:	$	650.082.636,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	4.462.324.289,00	
VALOR PAGADO:	$	157.103.303,58		VALOR PAGADO:	$	397.267.905,63	
VALOR POR PAGAR:	$	492.979.332,42		VALOR POR PAGAR:	$	4.065.056.383,37	
SUPERVISOR:	*DARIO MORALES*			INTERVENTOR	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA BOSA		

INICIO ETAPA 1

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
Hito 24	Flujo de caja	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 25	Presupuesto	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 28	Revisar y reportar las aprobaciones de las Empresas de Servicios Públicos y entidades distritales (Ej.: EAAB, Condensa/Enel, ETB, Gas Natural, DADEP, IDU, etc.)	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 32	Discriminación de la Oferta Económica	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 34	Elaborar diseños de intervención sobre el diagnostico presentado, (PARQUE 7-236 La Esperanza / 7-145 Piamonte I)	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 41	Diagnostico con análisis de los parques y segmento, (PARQUE 7-236 La Esperanza / 7-145 Piamonte I)	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 43	Entregar el presupuesto (balance financiero) para la ejecución del contrato	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 49	Cargar información en Secop II en caso de modificaciones contractuales	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 50	Revisión diagnósticos estudios y diseños (primera revisión)	31/08/2025	4/01/2026	126,00
Hito 52	Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto	31/08/2025	4/01/2026	126,00

FINALIZACIÓN ETAPA 1

INICIO ETAPA 2

2.1 CONTROL PRESUPUESTO DE OBRA, PARQUE LA ESPERANZA 7-236

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES

HITO	DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**PRELIMINARES**	1/11/2025	28/03/2026	147,00
2	**DESMONTES Y RETIROS**	20/11/2025	15/12/2025	25,00
3	**REALCES**	18/02/2026		no iniciado
4	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	22/11/2025	31/03/2026	129,00
5	**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO**	25/11/2025	25/03/2026	120,00
6	**RELLENOS**	27/12/2025	24/03/2026	87,00
7	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	2/01/2026	13/12/2025	20,00
8	**REDES Y CONDUCCIÓN**	24/12/2025	19/12/2025	5,00
9	**REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN**	18/02/2026		no iniciado
10	**ILUMINACIÓN**	3/03/2026		no iniciado
11	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	3/03/2026		no iniciado
12	**PISOS**	27/02/2026		no iniciado
13	**AISLAMIENTOS**	26/11/2025	7/03/2026	101,00
14	**PINTURA EXTERIORES**	27/01/2026		no iniciado
15	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	3/02/2026		no iniciado
16	**SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO**	27/12/2025		no iniciado
17	**SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN**	17/12/2025	14/12/2025	3,00
18	**CONFINAMIENTOS**	12/12/2025	1/12/2025	11,00
19	**MOBILIARIO URBANO**	9/02/2026	26/03/2026	45,00
20	**SEÑALIZACIÓN**	14/03/2026		no iniciado

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES					
HITO		DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO

2.2 ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARQUE LA ESPERANZA 7-236					
HITO		DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
NP-01	11712	DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M	13/02/2026		no iniciado
NP-02	10000	Demolición Manual sardinel (inc.cargue+retiro)**	10/03/2026		no iniciado
NP-03	10626	Demolición+reconstrucc pavimento cruce vías **	18/02/2026		no iniciado
NP-04	10860	Desmonte y retiro canecas	24/11/2025		no iniciado
NP-06	10909	Relleno rajón (mecánico) **	25/11/2025	18/03/2026	113,00
NP-07	IDU 4556	Relleno Sub base granular Reciclado Tipo A	1/12/2025	25/03/2026	114,00
NP-08	IDU 4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	18/12/2025	22/10/2025	57,00
NP-09		CÁMARA DE INSPECCIÓN PREFABRICADA H=1.00m) PARA ALCANTARILLADO, CON DIÁMETRO 1.20M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70M, SECCION CILINDRO D=1,20m X H=1,00, ESCALERA DE GATO NORMA NORMA EAAB NS-029-11V.3.4, MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL, GEOTEXTIL, EXCAVACION, PLACA FONDO Y EQUIPOS)	18/02/2026		no iniciado
NP-10		Zanja de Infiltración 4" (incluye excavación, instalación de tubería perforada, instalación de triturado de 1/12" y gravilla fina de 1/2" en capas de 30cm, instalación de tubería para inspección de nivel freático)	22/01/2026		no iniciado
NP-11		Zanja de Infiltración 6" (incluye excavación, instalación de tubería perforada, instalación de triturado de 1/12" y gravilla fina de 1/2" en capas de 30cm, instalación de tubería para inspección de nivel freático)	27/02/2026		no iniciado
NP-12	16670	Piso Caucho reciclado 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	17/03/2026		no iniciado
NP-13	16671	Piso Caucho reciclado 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst)	17/03/2026		no iniciado
NP-14	IDU 8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20m color amarillo. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	17/12/2025		no iniciado
NP-15	13016	Contenedor Raíces mampostería 1.2*1.2 h=1.57 **	3/02/2026		no iniciado
NP-16		Rampa en adoquín e=0.06	3/03/2026		no iniciado
NP-17	12186	Protector de Arbol M-91** (dos tubos)	9/02/2026		no iniciado
NP-19	106811	Estación entrenamiento funcional 11 usuarios	5/03/2026	11/03/2026	6,00
NP-20		MODULOS CALISTENIA Ref. TRX-002	20/02/2026	5/03/2026	13,00
NP-21	14695	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	20/03/2026		no iniciado
NP-22		SEÑALETICA DE NORMAS GENERALES PARA ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalación)	24/03/2026		no iniciado

2.3 ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARQUE LA ESPERANZA 7-145				
HITO	DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1,00	**PRELIMINARES**	24/11/2025	25/03/2026	121,00
2,00	**DESMONTES Y RETIROS**	26/11/2025	15/12/2025	19,00
3,00	**REALCES**	22/01/2026		no iniciado
4,00	**EXCAVACIONES CON RETIRO**	28/11/2025	10/03/2026	102,00
5,00	**NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO**	1/12/2025		no iniciado
6,00	**RELLENOS**	4/12/2025		no iniciado
7,00	**COLUMNAS, VIGAS, PLACAS Y SUPER-ESTRUCTURA**	22/01/2026		no iniciado
8,00	**REDES Y CONDUCCIÓN**	6/01/2026		no iniciado
9,00	**REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN**	6/01/2026		no iniciado
10,00	**ILUMINACIÓN**	3/03/2026		no iniciado
11,00	**SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA**	3/03/2026		no iniciado
12,00	**PISOS**	13/02/2026		no iniciado
13,00	**AISLAMIENTOS**	2/12/2025		no iniciado
14,00	**PINTURA EXTERIORES**	20/02/2026		no iniciado
15,00	**EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN**	9/03/2026		no iniciado
16,00	**SENDEROS Y ANDENES EN CONCRETO**	22/12/2025		no iniciado
17,00	**SENDEROS Y ANDENES EN ADOQUÍN**	29/12/2025		no iniciado
18,00	**CONFINAMIENTOS**	13/12/2025		no iniciado
19,00	**MOBILIARIO URBANO**	28/01/2026	12/12/2025	47,00
20,00	**SEÑALIZACIÓN**	10/02/2026		no iniciado

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES					
HITO		DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
2.4 ACTIVIDADES NO PREVISTAS PARQUE LA ESPERANZA 7-145					
HITO		DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
NP-01	11712	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M	6/02/2026		no iniciado
NP-02	10000	Demolición Manual sardinel (inc.cargue+retiro)**	17/02/2026		no iniciado
NP-03	10626	Demolición+reconstrucc pavimento cruce vías **	6/01/2026		no iniciado
NP-04	10860	Desmonte y retiro canecas	24/11/2025		no iniciado
NP-06	10909	Relleno rajón (mecánico) **	25/11/2025	12/03/2026	107,00
NP-07	IDU 4556	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido Manual, Humedecimiento y Compactación)	1/12/2025		no iniciado
NP-08	IDU 4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).	19/12/2025		no iniciado
NP-09		CÁMARA DE INSPECCIÓN PREFABRICADA H=1.00m) PARA ALCANTARILLADO, CON DIÁMETRO 1.20M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE PLACA DE CUBIERTA PREFABRICADA D= 1.70M, SECCION CILINDRO D=1,20m X H=1,00, ESCALERA DE GATO NORMA NORMA EAAB NS-029-11V.3.4, MATERIAL DE RELLENO ESTRUCTURAL, GEOTEXTIL, EXCAVACION, PLACA FONDO Y EQUIPOS)	18/02/2026		no iniciado
NP-10		Zanja de Infiltración 4" (incluye excavación, instalación de tubería perforada, instalación de triturado de 1/12" y gravilla fina de 1/2" en capas de 30cm, instalación de tubería para inspección de nivel freático)	22/01/2026		no iniciado
NP-11		Zanja de Infiltración 6" (incluye excavación, instalación de tubería perforada, instalación de triturado de 1/12" y gravilla fina de 1/2" en capas de 30cm, instalación de tubería para inspección de nivel freático)	27/02/2026		no iniciado
NP-12	16670	Piso Caucho recicl 9cm (EPDM 1cm+SBR 8cm sum+inst)	17/03/2026		no iniciado
NP-13	16671	Piso Caucho recicl 10cm (EPDM 1cm+SBR 9cm sum+inst)	17/03/2026		no iniciado
NP-14	IDU 8228	CENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA A57 / A58 ANCHO 0.20m color amarillo. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	17/12/2025		no iniciado
NP-15	13016	Contenedor Raíces mampostería 1.2*1.2 h=1.57 **	3/02/2026		no iniciado
NP-16		Rampa en adoquín e=0.06	3/03/2026		no iniciado
NP-17	12186	Protector de Árbol M-91** (dos tubos)	9/02/2026		no iniciado
NP-19	106811	Estación entrenamiento funcional 11 usuarios	5/03/2026		no iniciado
NP-20		MODULOS CALISTENIA Ref. TRX-002	20/02/2026		no iniciado
NP-21	14695	BOLARDO ALTO EN HIERRO M-63 (SUM + INST)	20/03/2026		no iniciado
NP-22		SEÑALETICA DE NORMAS GENERALES PARA ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalación)	24/03/2026		no iniciado
ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			1/04/2026	21/12/2025	**101,00**
Plazo del proyecto en días Cto Interventoría			17/05/2026	21/12/2025	**147,00**

No.	INDICADORES SEMANALES ETAPA DE DIAGNOSTICO	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 61.090.963,74	1,37%	**-1,24%**
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 5.704.805,69	0,13%	
3	Avance Físico Programado de las actividades conforme a la programación vigente. ETAPA DIAGNÓSTICOS	**100,00%**		**99,90%**
4	Avance Físico Ejecutado de las actividades conforme a la programación vigente. ETAPA DIAGNÓSTICOS	**0,10%**		
5	Avance Físico Programado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. ETAPA EJECUCIÓN	1,37%		**-1,24%**
6	Avance Físico Ejecutado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. ETAPA EJECUCIÓN	0,13%		
7	Avance Físico Programado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. GENERAL DEL PROYECTO	5,79%		**7,86%**
8	Avance Físico Ejecutado de las actividades o productos conforme a la programación vigente. GENERAL DEL PROYECTO	13,65%		
DÍAS DE ATRASO DESPUES DE LA FECHA DE LA ETAPA DE PRELIMINARES Y DIAGNOSTICO (va del 1 al 31 agosto 2025)				**126,00**
PROGRAMADO INTERVENTORIA				**31,07%**
EJECUTADO INTERVENTORIA				**29,53%**

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES				
HITO	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO**	**DÍAS DE RETRASO**

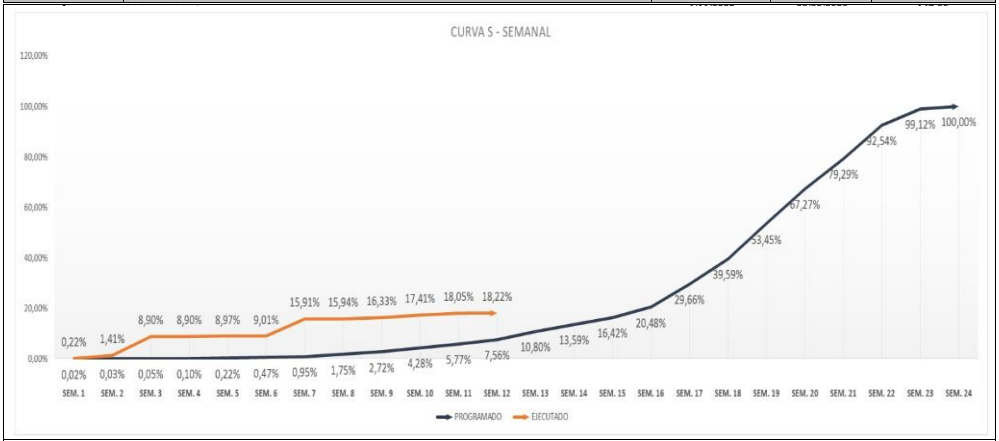

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Como resultado del seguimiento adelantado por esta Interventoría y de la revisión del Informe Semanal del Contratista (Semana 21), del Acta de Corte / Acta de Pago No. 3 y de la documentación soporte radicada, se identifican las siguientes situaciones problemáticas, las cuales no se derivan de la inexistencia de anexos —los cuales se encuentran completos— sino de aspectos relacionados con la planeación, coherencia programática, control de cantidades y consistencia de la información reportada.

Desalineación entre programación y ejecución
Se evidencia falta de correspondencia entre la programación vigente y la secuencia real de ejecución en campo, reflejada en diferencias entre el avance físico y el comportamiento financiero acumulado. Esta situación obedece principalmente a la necesidad de ajustar oportunamente el Programa Detallado de Trabajo (PDT) a la dinámica real de los frentes de obra, lo cual genera riesgo en la trazabilidad del control del plazo contractual.

Variaciones de cantidades en ítems contractuales
Del análisis del Acta de Corte No. 3 se identifican mayores y menores cantidades dentro de ítems contractuales existentes, así como ítems sin ejecución a la fecha del corte. Se aclara que estas variaciones corresponden a ajustes propios de la ejecución y que en el presente corte no se reconocen actividades clasificadas como No Previstos. La causa principal radica en las diferencias entre las condiciones reales de obra y las cantidades inicialmente estimadas, lo que exige conciliaciones técnicas permanentes.

Dependencia de definiciones técnicas
Se identifican actividades cuya continuidad depende de definiciones y validaciones técnicas específicas, lo cual condiciona la secuencia constructiva y puede generar ajustes a la programación. Esta situación se origina en la necesidad de compatibilizar soluciones técnicas con las condiciones reales del proyecto y los lineamientos aplicables.

Inconsistencias formales en la información reportada
Aunque la documentación soporte del Acta de Corte No. 3 se encuentra completa, en el Informe Semanal del Contratista se presentan inconsistencias formales en carátulas y cuadros resumen, relacionadas con errores materiales en fechas y presentación de porcentajes, atribuibles a deficiencias en el control de calidad previo a la radicación.

Conclusión
Las situaciones identificadas evidencian la necesidad de fortalecer la articulación entre planeación, ejecución, medición y control, así como de mejorar los procesos de conciliación de cantidades y validación de la información reportada, sin que ello obedezca a carencias documentales del expediente contractual.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Actualizar y ajustar el Programa Detallado de Trabajo (PDT), incorporando la secuencia real de ejecución por frentes, holguras, ruta crítica y coherencia con el avance físico y financiero.	Contratista – Director de Obra	Dentro de los ocho (8) días calendario siguientes
Alinear el flujo de caja con el avance físico real del proyecto, garantizando coherencia entre programación, medición de cantidades y valores reconocidos.	Contratista – Área Administrativa y Financiera	Dentro de los ocho (8) días calendario siguientes
Realizar conciliaciones técnicas periódicas de cantidades ejecutadas por frente y actividad, dejando trazabilidad entre planos, topografía, bitácora de obra y actas de corte.	Contratista – Residente de Obra	Seguimiento y actualización semanal
Definir y formalizar oportunamente las soluciones técnicas que condicionan la secuencia constructiva, previo a su ejecución en obra.	Contratista – Dirección Técnica	Previo a la ejecución de cada actividad condicionada
Fortalecer el control de calidad en la elaboración y revisión de informes semanales, verificando coherencia de fechas, porcentajes y datos contractuales antes de su radicación.	Contratista – Dirección de Proyecto	Implementación inmediata y permanente
Realizar seguimiento, verificación y control al cumplimiento del presente Plan de Acción.	Interventoría	Seguimiento semanal

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En desarrollo del seguimiento técnico adelantado por esta Interventoría y con base en la revisión del Acta de Corte / Acta de Pago No. 3, así como de los soportes documentales que la acompañan, se deja constancia de que en el presente corte no se reconocen ni se liquidan actividades clasificadas como No Previstos.
No obstante lo anterior, durante la ejecución de las actividades correspondientes al periodo evaluado se identifican variaciones en las cantidades ejecutadas dentro de ítems contractuales existentes, las cuales obedecen a ajustes propios de la ejecución y a las condiciones reales encontradas en campo, sin que ello implique la incorporación de nuevos ítems al alcance contractual.

Las mayores y menores cantidades observadas se derivan principalmente de:
- Diferencias entre las cantidades inicialmente estimadas y las condiciones físicas reales del terreno.
- Ajustes en las dimensiones y volúmenes requeridos para garantizar la funcionalidad, estabilidad y correcta ejecución de las actividades.
- Afinaciones progresivas de medición asociadas a la ejecución por frentes de obra y a la necesidad de compatibilizar las actividades con los diseños y especificaciones técnicas vigentes.

Esta Interventoría verificó que las cantidades reconocidas en el Acta de Corte No. 3 corresponden a obra efectivamente ejecutada, medida y soportada, conforme a las especificaciones contractuales y a los registros de campo, tales como bitácora de obra, registros topográficos, control de cantidades y evidencias fotográficas.
Se reitera que las variaciones de cantidades identificadas no constituyen actividades no previstas, sino ajustes cuantitativos dentro de ítems contractuales existentes, propios de la etapa inicial de ejecución del contrato. En consecuencia, cualquier requerimiento futuro que implique la ejecución de actividades no contempladas contractualmente deberá ser previamente justificado, evaluado y formalizado conforme a los procedimientos contractuales aplicables, antes de su ejecución y reconocimiento económico.

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Con base en el seguimiento técnico, administrativo y financiero realizado durante el periodo evaluado, y una vez revisada la información aportada por el Contratista, esta Interventoría deja constancia de que el desarrollo de las actividades ejecutadas y reconocidas en el Acta de Corte / Acta de Pago No. 3 corresponde a obra efectivamente ejecutada, medida y soportada conforme a las condiciones contractuales y a las especificaciones técnicas aplicables.

Se verifica que la documentación soporte del corte se encuentra completa y organizada, permitiendo la trazabilidad entre la ejecución en campo, las cantidades certificadas y el valor económico reconocido. No obstante, del análisis integral se identifican aspectos que requieren ser fortalecidos por parte del Contratista, principalmente en lo relacionado con la coherencia entre la programación contractual, la secuencia real de ejecución por frentes de obra y el comportamiento del avance físico y financiero del proyecto.

Así mismo, se evidencian variaciones de cantidades dentro de ítems contractuales existentes, las cuales corresponden a ajustes propios de la ejecución y a las condiciones reales encontradas en campo, sin que en el presente corte se reconozcan actividades clasificadas como No Previstos. Estas variaciones deberán continuar siendo objeto de conciliación técnica permanente, a fin de evitar acumulaciones significativas en cortes posteriores.

La Interventoría resalta la necesidad de que el Contratista implemente de manera oportuna las acciones definidas en el Plan de Acción, en especial aquellas orientadas a la actualización del Programa Detallado de Trabajo (PDT), el fortalecimiento del control de cantidades y la mejora en la calidad y consistencia de la información consignada en los informes periódicos.

En consecuencia, esta Interventoría continuará realizando el seguimiento y control permanente a la ejecución del contrato, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la correcta ejecución de las actividades programadas y la mitigación de los riesgos identificados, dejando constancia de que la aprobación de los cortes de obra se mantiene condicionada a la verificación técnica, documental y administrativa de cada periodo evaluado.

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES				
HITO	**DESCRIPCIÓN**	**FECHA PROGRAMADA**	**FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO**	**DÍAS DE RETRASO**

SST: Durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 3 de enero de 2026, las actividades del contratista se limitaron a los días 29 y 30 de diciembre, centrando la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) exclusivamente en el Parque la Esperanza ante la ausencia de labores en el Parque Piamonte. En este marco, se llevó a cabo la verificación de documentación SST, la supervisión de orden y aseo, y el acompañamiento técnico a las actividades en obra; paralelamente, en el área administrativa, se gestionó el levantamiento de observaciones del informe No. 5 y de los informes semanales, obteniendo la respectiva no objeción. Cabe señalar que durante este ciclo no se realizaron comités de obra y queda como compromiso pendiente la entrega de la investigación del accidente de trabajo (AT) relacionado con el señor Felipe Ruidiaz Florián.

AMBIENTAL: Desde el área ambiental, se realizaron las siguientes actividades; jornada de orden y aseo, mantenimiento de cerramiento general y de individuos árbitros, dichas actividades fueron desarrolladas el dia 29 y 30 de diciembre. En el parque Piamonte, no se desarrolló ninguna actividad en obra. El informe ambiental N5 se encuentra en etapa de revisión por parte de interventoría.

TECNICO: Durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, la Interventoría adelantó actividades de seguimiento técnico, administrativo y financiero al Contrato de Obra No. 703 de 2024, orientadas a la verificación del avance del proyecto, la revisión documental y el control del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En desarrollo de dichas actividades, la Interventoría realizó la revisión integral y validación técnica del Acta de Corte / Acta de Pago No. 3, verificando la correspondencia entre las actividades ejecutadas en campo, las cantidades medidas, los soportes documentales presentados y el valor económico reconocido, dejando constancia de que en el presente corte no se reconocen actividades clasificadas como No Previstos.
La Interventoría adelantó la verificación de la documentación soporte del corte, constatando que los anexos se encuentran completos y organizados en carpetas independientes, lo cual permite la trazabilidad entre la ejecución de obra, las cantidades certificadas y los valores reconocidos. No obstante, se formularon observaciones técnicas orientadas a mejorar la consistencia de los cuadros de control y la calidad de la información consignada en los informes periódicos. De igual forma, se realizó el seguimiento a la ejecución de actividades en los frentes de obra, mediante revisión de registros fotográficos, bitácora de obra y soportes de medición, verificando que las actividades reportadas corresponden a obra efectivamente ejecutada conforme a las especificaciones técnicas y lineamientos contractuales. En el ámbito administrativo y contractual, la Interventoría elaboró y estructuró el Plan de Acción derivado del análisis de causas, definiendo actividades, responsables y plazos orientados a corregir las situaciones problemáticas identificadas, particularmente en lo relacionado con la actualización del Programa Detallado de Trabajo (PDT), la conciliación de cantidades y la alineación entre programación, ejecución y control financiero. Finalmente, la Interventoría mantuvo la comunicación permanente con el Contratista, a través de la revisión y emisión de observaciones técnicas, con el fin de asegurar la atención oportuna de los requerimientos formulados y garantizar la continuidad del seguimiento y control del contrato durante el periodo evaluado.

SOCIAL: Durante el periodo reportado se realizó la atención del Punto CREA y no se recibió ninguna PQRS, la interventoría realizó verificación a esta actividad. El 30 de diciembre de 2025 se realizaron 5 actas de vecindad en el parque 07-145 ubicado en Bosa Piamonte, la interventoría realizó verificación de esta actividad.
• A la fecha el contratista una vinculación de: Total, empleos directos del contrato: 25
• Total, empleos directos e indirectos de mujeres del contrato: 8
• Total, empleos indirectos del contrato: 10
• Total, empleos directos e indirectos de jóvenes del contrato: 1
La interventoría ha realizado verificación de esta vinculación
La interventoría remitió lista de chequeo con calificación del 100%

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Instalacion adoquin Parque La Esperanza 7-236

Instalacion adoquin Parque La Esperanza 7-236

Instalacion adoquin Parque La Esperanza 7-236

Instalacion adoquin Parque La Esperanza 7-236

Instalacion adoquin Parque La Esperanza 7-236

Fundida de cinta en concreto Parque La Eseranza 7-236

Fundida de cinta en concreto Parque La Eseranza 7-236

Fundida de cinta en concreto Parque La Eseranza 7-236

Instalacion Adoquin Parque La Esperanza 7-236

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: ***GERMAN ESPINEL PARRA***

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

NOMBRE SUPERVISOR: ***DAIRO MORALES***

CONDICIONES INICIALES CONTRACTUALES				
HITO	DESCRIPCIÓN	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
